



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

REFERATO SULL'ATTUAZIONE DEL PNRR DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA CONTROLLO SULLA GESTIONE

(art. 3, co. 4, l. n. 20/1994; art.7, comma 7, d.l. 31 maggio 2021 n.77)

Relatore: Salvatore Pilato





CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

REFERATO SULL'ATTUAZIONE DEL PNRR DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA CONTROLLO SULLA GESTIONE

(art. 3, co. 4, l. n. 20/1994; art.7, comma 7, d.l. 31 maggio 2021 n.77)

PRESIDENTE: SALVATORE PILATO

Ha collaborato:

Dott.ssa Monica Sanzo

SOMMARIO

- 1. INQUADRAMENTO NORMATIVO**

- 2. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI**
 - 2.1 Avanzamento amministrativo**
 - 2.2 Avanzamento finanziario**
 - 2.3 Progetti rimodulati**

- 3. PROGETTI CON SOGGETTI ATTUATORI ESTERNI**

- 4. INCARICHI ESTERNI**

- 5. ALTRE INFORMAZIONI**

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

La Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana, in continuità con l'attività di programmazione dei controlli, per l'anno 2024, di cui alla deliberazione n. 51/2024/INPR (adottata il 6 marzo 2024) e tenendo conto delle novità intervenute nel contesto normativo, svolge il controllo sulla gestione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, della l. n. 20/1994 e dell'art. 7 del d.l. n. 77/2021.

In proposito, si evidenzia che, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 12 *quinquies*, lett. b), del d.l. 22 aprile 2023, n. 44, convertito nella l. 21 giugno 2023, n. 74, che, a modifica dell'art. 22 del d.l. n. 76/2022 sul controllo concomitante, ha escluso dallo stesso controllo i piani, programmi e progetti previsti o finanziati dal PNRR o dal piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), la Sezione, in occasione della programmazione dei controlli per l'anno 2024, con la suindicata deliberazione n. 51/2024/INPR, ha reindirizzato il controllo dei predetti piani, programmi e progetti previsti o finanziati dal PNRR o dal PNC nella materia dei *"controlli successivi sulla gestione con specifica rilevanza economico-finanziaria"* ovvero nell'ambito dei controlli-referto sulla finanza locale e regionale *"da avviare in collaborazione ed in coordinamento con la Sezione Autonomie, tra i quali assume una particolare priorità "la verifica degli avanzamenti degli investimenti PNRR e PNC" e "[dell'] efficienza nella utilizzazione delle risorse del FSC, del PNRR e del PNC"*.

Con particolare riferimento al controllo sulla gestione degli interventi PNRR e PNC, la Sezione delle Autonomie, nel ritenere che *"i controlli sulla gestione non possono attendere l'esito conclusivo delle attività, che, nella maggior parte dei casi, è molto protratto nel tempo"*, ha avuto occasione di chiarire che detti controlli devono *"focalizzarsi su segmenti di gestione connessi alla realizzazione degli obiettivi intermedi"* (deliberazione n. 1/SEZAUT/2023/INPR).

In siffatto assetto normativo e giurisprudenziale, la valutazione gestionale della Corte, a fronte di interventi che nella maggior parte dei casi dovrebbero giungere a completamento entro il 2026, investe il raggiungimento dei risultati intermedi e la progressione dei relativi procedimenti amministrativi da parte dei soggetti attuatori.

In particolare, il controllo sulla gestione, secondo quanto stabilito dall'art. 7 del d.l. n. 77/2021 e dall'art. 3 della l. n. 20/1994, viene svolto *"anche in corso di esercizio"*, effettuando *"valutazioni di economicità efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego"* delle relative risorse, verificando *"la legittimità e la regolarità"* dell'utilizzo delle risorse stesse e accertando *"la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge"*.

La Sezione delle Autonomie nella deliberazione riguardante il *“Contributo alla relazione ex art. 7, comma 7, D.L. 31 maggio 2021 n. 77”* (II semestre 2023) si è soffermata sulle finalità del controllo sulla gestione sui progetti del PNRR e PNC, evidenziando che *“nella legislazione dedicata al PNRR e in particolare, all’art 1, co. 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, viene fatto riferimento alla responsabilità delle Amministrazioni e degli organismi titolari dei progetti finanziati per l’attuazione del programma Next Generation EU «conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea (...), nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali».* Inoltre, il Documento della Commissione Europea *“Commission Staff Working Document Guidance to Member States Recovery and Resilience Plans”* (SWD-2020 205 final) fa esplicito riferimento a tale profilo, individuando con la locuzione *“sound financial management”*, il concetto di *“sana gestione finanziaria”*, che ricade nel perimetro di controllo che la Corte dei conti è chiamata a garantire. *L’esigenza di un’oculata programmazione e gestione della spesa è fondamentale nell’ottica di preservare la sana gestione finanziaria dell’ente”* (deliberazione n.16/2023/FRG).

Nel contesto normativo e giurisprudenziale richiamato si inserisce la presente deliberazione riguardante il controllo sulla gestione nella fase di attuazione, finanziaria e procedurale, degli interventi di cui la Città Metropolitana di Messina è soggetto attuatore e/o beneficiario.

2. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

La Sezione, in continuità con la suddetta deliberazione n. 51/2024/INPR, ha avviato l’attività istruttoria nel mese di giugno 2024, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti del PNRR e del PNC nei confronti della Città Metropolitana di Messina, in qualità di *“soggetto attuatore”*.

Con nota prot. Cdc n. 4398 del 04/06/2024, è stato chiesto all’Ente di fornire i dati anagrafici nonché i dati informativi sull’avanzamento amministrativo e finanziario di ciascun progetto, **aggiornati al 30 giugno 2024**, attraverso la compilazione di una tabella avente lo stesso contenuto della *“Tabella PNRR”* approvata con la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 8/2024/INPR recante *“Linee guida per la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2023, per l’attuazione dell’art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266”*.

La Città Metropolitana di Messina ha riscontrato le richieste istruttorie della Sezione con documentazione pervenuta in data 23.07.2024 e acquisita al prot. Cdc n. 5516.

All’esito dell’attività istruttoria, questa Sezione, al fine di garantire il contraddittorio, in data 17.01.2025 - prot. Cdc n. 487 - ha trasmesso alla Città Metropolitana di Messina una *“bozza di referto”*

sull'attuazione dei progetti PNRR dell'Ente, con invito a presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni entro quindici giorni dal ricevimento.

La Città Metropolitana di Messina ha trasmesso le proprie controdeduzioni che sono state acquisite al prot. Cdc n. 1054 del 31.01.2025.

Nell'ambito dell'istruttoria, sono stati presi in esame tutti gli interventi gestiti direttamente dalla Città Metropolitana di Messina in qualità di "soggetto attuatore", ovvero gli interventi con una ricaduta finanziaria effettiva sul bilancio, quale ente direttamente beneficiario dei finanziamenti stanziati dal PNRR (di natura esclusivamente europea dal dispositivo RRF o dei fondi del PNC) e la cui gestione è sotto il diretto controllo dell'Ente o di enti strumentali o di supporto coinvolti a vario titolo nella realizzazione dei progetti e individuati dal soggetto attuatore nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente (es. in materia di appalti pubblici)¹.

Gli enti locali sono soggetti attuatori qualora provvedano direttamente alla realizzazione degli interventi, oppure soggetti beneficiari quando si avvalgono di enti strumentali o di altri soggetti, anche privati, per l'esecuzione del progetto.

Il d.l. n. 77/2021 con l'art. 10, comma 1, consente, infatti, agli enti locali titolari di fondi del PNRR di affidare le risorse di cui sono beneficiari ad altri soggetti che attuino materialmente gli interventi, tra cui le società partecipate in-house qualificate ai sensi dell'art. 38 del Codice dei contratti.

In questo caso, l'amministrazione è tenuta a stipulare una convenzione con l'ente strumentale, che ne specifichi il ruolo, la responsabilità e la remunerazione.²

La Sezione ha verificato lo stato di avanzamento degli interventi nei quali la Città Metropolitana di Messina è soggetto attuatore sulla base degli esiti dell'attività istruttoria e avvalendosi degli elementi conoscitivi di cui alla piattaforma ReGIS³.

¹ L'art.9 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 (in breve d.l. n.77/2021) stabilisce che "alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente."

² Il beneficiario, anche laddove non figuri come soggetto attuatore, è tenuto a monitorare lo stato di attuazione o dalla rendicontazione delle risorse, che transitano dal bilancio dell'ente. Nel momento del riparto delle risorse, viene infatti siglata una convenzione tra ministero e beneficiario, che stabilisce in dettaglio gli obblighi, tra cui quello di garantire l'attuazione del progetto nei tempi stabiliti dal cronoprogramma e la conservazione di tutta la documentazione contabile allo scopo di garantire la corretta rendicontazione.

³ Le informazioni circa gli interventi vengono monitorate attraverso ReGIS, che, come stabilisce la circolare del MEF-RGS n. 27 del 21/6/2022, è la piattaforma informatica unica alimentata dai soggetti attuatori con i dati relativi ai progetti del PNRR. La stessa circolare chiarisce che "I soggetti Attuatori sono responsabili della corretta alimentazione del sistema ReGIS con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di loro competenza. In particolare, provvedono, con cadenza mensile ad aggiornare i dati registrati sul sistema e renderli disponibili per le Amministrazioni titolari delle misure ai fini delle operazioni di controllo e validazione di competenza". Inoltre, la successiva circolare del MEF-RGS n. 29 del 26/7/2022 ha stabilito

L'Ente ha indicato n. **44 progetti** di cui n. **4** della tipologia "non nativi PNRR", la cui origine precede il PNRR ma che sono stati successivamente inseriti tra i progetti finanziabili dal PNRR⁴.

Gli interventi di cui la Città Metropolitana di Messina è soggetto attuatore sono rappresentati dalla seguente tabella:

Tabella 1- Progetti PNRR e PNC suddivisi per missione e per tipologia

Intervento	n. CUP	non nativi PNRR
totale M1	0	0
totale M2	20	0
totale M3	0	0
totale M4	12	4
totale M5	12	0
totale M6	0	0
totale	44	4

Occorre preliminarmente rappresentare che l'Ente ha indicato, per n. 20 dei n. 44 progetti segnalati (di cui n. 19 appartenenti alla Missione 2 e n. 1 appartenente alla Missione 5), l'affidamento a "soggetti sub-attuatori" quali enti strumentali per l'attuazione degli interventi: si tratta di alcuni comuni dell'area metropolitana (v. infra par. 3).

La Città Metropolitana di Messina, nel dettaglio, risulta soggetto attuatore di n. 20 progetti della Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica), n. 12 nella Missione 4 (Istruzione e ricerca) e n. 12 nella Missione 5 (Inclusione e coesione).

In sede istruttoria, era stato richiesto all'Ente di indicare, per ciascun progetto, "eventuali procedure di gara espletate ai fini dell'attuazione degli interventi, indicando la relativa tipologia di affidamento; soggetto incaricato della progettazione; soggetti aggiudicatari".

La Città Metropolitana non aveva provveduto a fornire dette informazioni per la totalità degli interventi.

In sede di riscontro alla bozza di referto, l'Ente ha inviato n. 44 schede progetto, suddivise per Missione, relative alle procedure di gara espletate e ai soggetti aggiudicatari.

che la piattaforma ReGiS costituisce la base informativa su cui vengono registrate le varie fasi di attuazione del piano, ovvero avvio, finanziamento, stato di avanzamento dei lavori, fino alla rendicontazione finale, da parte delle Amministrazioni titolari degli interventi del PNRR.

⁴ Proprio perché questi progetti non sono nati nell'ambito del PNRR, occorre che nella fase di rendicontazione possano soddisfare i vincoli posti dal piano quale per esempio i vincoli di sostenibilità ambientale, noti con l'acronimo DNSH (Do Not Significant Harm), ovvero che non arrechino danni agli obiettivi di salvaguardia ambientale.

Occorre evidenziare, tuttavia, che per n. 6 progetti appartenenti alla Missione 2, le schede non sono state completate; si tratta dei seguenti CUP: D22F23000690007 - E32F23000340006 - E62F23000250001 - E72F23000590006 - F82F23000590006 - D12F23000490001.

Pertanto, la Sezione accerta il permanere di dette lacune informative per gli interventi menzionati.

In fase istruttoria, era stata elaborata la seguente Tabella 2 “Fonti del finanziamento dei progetti PNRR e PNC” suddivisi per missione e tipologia di fonte:

Tabella 2 - Fonti del finanziamento dei Progetti PNRR e PNC

Missione	Fondi RRF (€)	Fondi PNC (€)	FOI (€)	Fondi Ente (€)	Altri Fondi (€)	Totale finanziamento (€)	%
totale M2	41.467.722,03 €	0,00 €	373.765,83 €	1.440.821,12 €	0,00 €	43.282.308,98 €	12,57
totale M4	48.433.866,88 €	0,00 €	0,00 €	782.309,60 €	0,00 €	49.216.176,48 €	14,29
totale M5	228.587.213,11 €	3.173.508,13 €	19.921.581,45 €	142.092,76 €	0,00 €	251.824.395,45 €	73,14
totale	318.488.802,02 €	3.173.508,13 €	20.295.347,28 €	2.365.223,48 €	0,00 €	344.322.880,91 €	

Fonte: elaborazioni Cdc sulla base dei riscontri istruttori.

In sede di riscontro alla bozza di referto, la Città Metropolitana di Messina rappresenta che “a seguito dell’emanazione del Decreto 12 giugno 2024 del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno che rettifica ed integra il Decreto 26 giugno 2023, con definizione delle fonti di finanziamento PUI - PNRR e PUI - nazionale per singole progettualità e relativi allegati, sono state ridefinite le fonti di finanziamento a valere sulle risorse PNRR, PNC e risorse statali (art. 1 comma 5 lettera del D.L. 19/2024)”. E provvede ad elaborare la seguente tabella, aggiornata al 30/01/2025:

Missione	Fondi RRF €	Fondi PNC €	Fondi Stato €	FOI €	Fondi Ente €	Altri Fondi €	Totale finanziamento	%
Totale M2	41.467.722,03	-	-	373.765,83	1.440.821,12	-	43.282.308,98	12,57
Totale M4	48.433.866,88	-	-	-	782.309,60	-	49.216.176,48	14,29
Totale M5	170.460.164,28	11.886.444,43	49.414.112,53	19.921.581,45	142.092,76	-	251.824.395,45	73,14
Totale	260.361.753,19	11.886.444,43	49.414.112,53	20.295.347,28	2.365.223,48	-	344.322.880,91	100,00

La tabella mostra una nuova ripartizione dei fondi PNRR, PNC e risorse ex art. 1 co 5 lettera d) del D.L. 19/2024.

In particolare, i “Fondi Stato” indicati nella tabella formulata dall’Ente - per un totale di euro 49.414.112,53 - fanno riferimento a n. 11 PUI (Piani Urbani Integrati) della Città Metropolitana di Messina, appartenenti alla Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2, il cui dettaglio è fornito


nell' Allegato n. 2 "Dettaglio PUI-PNRR", parte integrante del decreto 12 giugno 2024 citato che all' art. 1 comma 2 recita "Gli interventi, indicati all'interno dell' Allegato n. 2, per i quali è stata confermata la data di conclusione dei lavori, comprensiva della trasmissione del certificato di collaudo, entro il 30 giugno 2026, in linea con il Target finale della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2. del PNRR, sono finanziati a valere sulle risorse del PNRR, del PNC e delle altre risorse nazionali di cui all' art. 1, comma 5, lett. d) del Decreto-legge n. 19/2024, secondo le quote parti specificate".

Di seguito, il dettaglio dei finanziamenti a carico dello Stato per la Città Metropolitana di Messina, estratti dall' Allegato 2:

Città Metropolitana	n. PUI	Titolo Piano Urbano Integrato	Area di intervento in mq	CUP	Soggetto attuatore	Importo Finanziamento	di cui risorse PNRR	di cui risorse PNC	di cui risorse statali (art. 1, co. 5, lett. d) DL 19/2024)
MESSINA	10	"CITTÀ DEL RAGAZZO"	43.000,00	B44D22000200006	Città Metropolitana di Messina	55.660.266,00	29.841.630,71	5.006.345,60	20.812.289,68
Sub-totale Piano Urbano Integrato n. 10						55.660.266,00			

Città Metropolitana	n. PUI	Titolo Piano Urbano Integrato	Area di intervento in mq	CUP	Soggetto attuatore	Importo Finanziamento	di cui risorse PNRR	di cui risorse PNC	di cui risorse statali (art. 1, co. 5, lett. d) DL 19/2024)
MESSINA	11	"AREE ESTESE A VALENZA AMBIENTALE, CULTURALE E TURISTICO-SOCIALE"	126.224,98	B47B22000040006	Città Metropolitana di Messina	21.673.631,00	11.620.075,49	1.949.428,11	8.104.127,40
				B87B22000030006	Città Metropolitana di Messina	7.551.408,00	4.048.603,16	679.209,08	2.823.595,76
				B42F22000090006	Città Metropolitana di Messina	13.936.588,00	7.471.946,19	1.253.522,15	5.211.119,66
				B42F22000100006	Città Metropolitana di Messina	2.230.921,00	1.196.083,41	200.659,51	834.178,09
				B44J22000030006	Città Metropolitana di Messina	10.000.000,00	5.361.388,45	899.446,94	3.739.164,61
				B41I22000040006	Città Metropolitana di Messina	1.000.000,00	536.138,84	89.944,69	373.916,46
				B41I22000050006	Città Metropolitana di Messina	600.000,00	321.683,31	53.966,82	224.349,88
				B41I22000060006	Città Metropolitana di Messina	500.000,00	268.069,42	44.972,35	186.958,23
				B41I22000070006	Città Metropolitana di Messina	3.000.000,00	1.608.416,53	269.834,08	1.121.749,38
				B41I22000080006	Città Metropolitana di Messina	16.000.000,00	8.578.221,52	1.439.115,11	5.982.663,38
Sub-totale Piano Urbano Integrato n. 11						76.492.548,00			

Alla luce di quanto contro dedotto dall'Ente alla bozza di referto, emerge che l'ammontare complessivo del costo dei progetti rimane invariato ed è pari a euro 344.322.880,91, mentre mutano le percentuali delle diverse fonti di finanziamento, rappresentate dal grafico che segue:

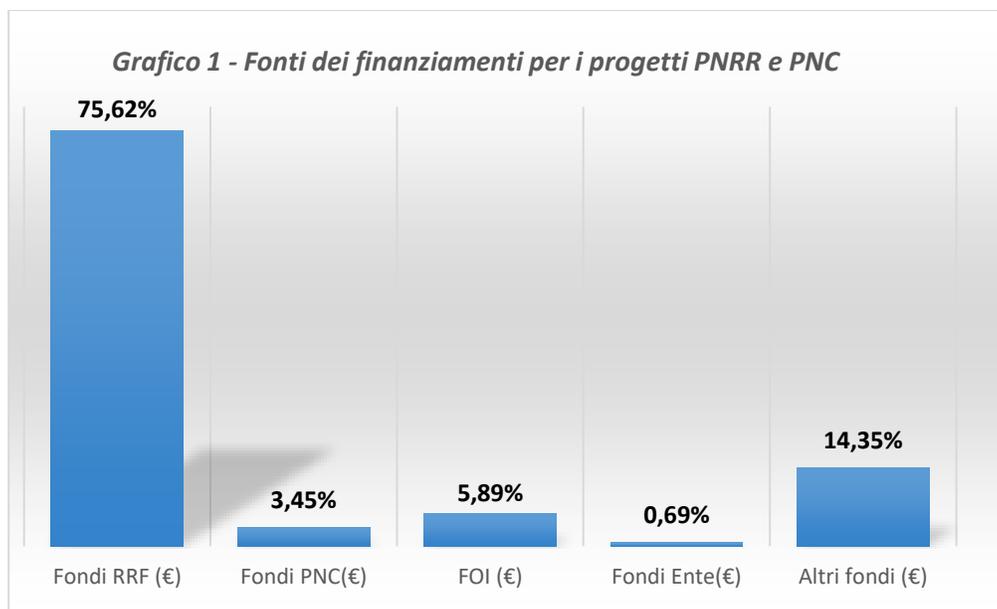

Con riferimento alla tipologia delle fonti di finanziamento, infatti, la Sezione accerta che le risorse provenienti dal dispositivo Recovery and Resilience Facility (RRF), ovvero il fondo che finanzia il PNRR, corrispondono al 75,62 per cento del totale, mentre le risorse del Piano Nazionale Complementare (PNC), ovvero i fondi pubblici nazionali che affiancano il PNRR e che seguono, sia per la rendicontazione sia per l'attuazione, le stesse procedure del PNRR, sono pari al 3,45 per cento. Il resto delle risorse proviene dal Fondo per le Opere Indifferibili (FOI), che contribuisce con il 5,89 per cento dei fondi complessivi, da risorse proprie dell'Ente per lo 0,69 per cento, e da "Altri fondi pubblici" per il 14,35 per cento.

Nella Tabella 3, il dettaglio del finanziamento dei singoli progetti, univocamente identificati mediante il Codice Unico di Progetto (CUP):

Tabella 3 - Elenco dei progetti PNRR e PNC per CUP

Missione - Componente - Investimento	CUP	Denominazione progetto	Totale finanziamento
M2C4I3.1	F42F22000520006	COMUNE DI MESSINA*PROVINCIALE 35*INTERVENTO DI FORESTAZIONE URBANA DEL COMUNE DI MESSINA AREA BURGENSATICO DI PEZZOLO	1.750.000,00 €

M2C4I3.1	E32F22000290006	INTERVENTO DI IMBOSCHIMENTO CON FINALITÀ PROTETTIVE DA RISCHIO IDROGEOLOGICO IN CONTRADA PUZZO DEL COMUNE DI ALÌ*CONTRADA PUZZO*INTERVENTO DI IMBOSCHIMENTO CON FINALITÀ PROTETTIVE DA RISCHIO IDROGEOLOGICO IN CONTRADA PUZZO DEL COMUNE DI ALÌ	1.750.000,00 €
M2C4I3.1	F82F22000720006	PROGETTO DI FORESTAZIONE DI SUPERFICI EXTRAURBANE, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO, PER LA PREVENZIONE, RIPRISTINO E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ*VIA TERRITORIO COMUNALE MONTANO*INTERVENTO DI FORESTAZIONE E RIPRISTINO DI AREE PERCORSE DA INCENDIO PREVISTA IN 53.21.20 ETTARI	2.185.000,00 €
M2C4I3.1	I12F22000400006	INTERVENTO DI FORESTAZIONE URBANA PERIURBANA ED EXTRAURBANA NEL COMUNE DI OLIVERI DENOMINATO: RESPIRA OLIVERI*VIA TERRITORIO DEL COMUNE DI OLIVERI*INTERVENTO DI FORESTAZIONE URBANA PERIURBANA ED EXTRAURBANA NEL COMUNE DI OLIVERI	1.630.000,00 €
M2C4I3.1	F42F22000470006	FORESTAZIONE DI SUPERFICI EXTRAURBANE, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LIBRIZZI, PER LA PREVENZIONE, RIPRISTINO E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ, CON FINALITÀ PRINCIPALMENTE CLIMATICO-AMBIENTALE, PROTETTIVE, PAESAGGISTICHE E SOCIALI*CAVALLAZZO ECC*FORESTAZIONE DI SUPERFICI EXTRAURBANE, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LIBRIZZI, PER LA PREVENZIONE, RIPRISTINO E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ, CON FINALITÀ PRINCIPALMENTE CLIMATICO-AMBIENTALE, PROTETTIVE, PAESAGGISTICHE E SOCIALI	2.140.300,00 €
M2C4I3.1	J82F22000460006	CASTROREALE GREEN GREEN	2.398.183,20 €
M2C4I3.1	C62F22000520006	TERRITORIO MONTANO COMUNALE CCR CORRIDOIO ECOLOGICO - STRADE CITTADINE PARCO URBANO AREA PIP ZONE ADIACENTI CAMPO SPORTIVO*ZONA MONTANA E AREE URBANE*FORESTAZIONE URBANA ED EXTRAURBANA	2.184.682,93 €

M2C4I3.1	D22F22000640006	INTERVENTI DI FORESTAZIONE NEL COMPRESORIO DELLA VALLE DELL'ALCANTARA*LOCALITÀ VARIE*INTERVENTI DI FORESTAZIONE DA REALIZZARSI NEL COMPRESORIO DELLA VALLE DELL'ALCANTARA NEI COMUNI DI FRANCAVILLA DI SICILIA, GAGGI, GIARDINI NAXOS, GRANITI, MALVAGNA, MOIO ALCANTARA, MOTTA CAMASTRA E TAORMINA	1.824.800,00 €
M2C4I3.1	E62F23000250001	COMUNE DI MILITELLO ROSMARINO (ME)*FOGLIO 1 PART. 112; FOGLIO 3 PARTT. 39 E 51; FOGLIO 9 PARTT. 17 E 283.*INTERVENTO DI RIMBOSCHIMENTO IN AREE URBANE	1.365.836,36 €
M2C4I3.1	D12F23000490001	INTERVENTO DI FORESTAZIONE URBANA, PERIURBANA ED EXTRAURBANA DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR, MISURA 2 COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO" - COMUNI DI VILLAFRANCA TIRRENA E SAPONARA*SERRO*RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE CON INTERVENTO DI RIMBOSCHIMENTO	1.244.461,64 €
M2C4I3.1	I32F23000420006	PROGETTO DI FORESTAZIONE DI SUPERFICI EXTRAURBANE, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TUSA, PER LA PREVENZIONE, RIPRISTINO E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ, CON FINALITÀ PRINCIPALMENTE CLIMATICO-AMBIENTALE, PROTETTIVE, PAESAGGISTICHE E SOCIALI.*TARDARA*PROGETTO DI FORESTAZIONE DI SUPERFICI EXTRAURBANE, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TUSA, PER LA PREVENZIONE, RIPRISTINO E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ, CON FINALITÀ PRINCIPALMENTE CLIMATICO-AMBIENTALE, PROTETTIVE, PAESAGGISTICHE E SOCIALI.	3.200.000,00 €
M2C4I3.1	E32F23000340006	INTERVENTO DI IMBOSCHIMENTO CON FINALITÀ PROTETTIVE DA RISCHIO IDROGEOLOGICO IN CONTRADA PUZZO-GABBIA ALLE PENDICI DI MONTE SCUDERI NEL COMUNE DI ALÌ*CONTRADA PUZZO/GABBIA*IMBOSCHIMENTO CON FINALITÀ PROTETTIVE DA RISCHIO IDROGEOLOGICO IN CONTRADA PUZZO-GABBIA ALLE PENDICI DI MONTE SCUDERI NEL COMUNE DI ALÌ	1.760.000,00 €

M2C4I3.1	F82F23000590006	PROGETTO DI FORESTAZIONE DI SUPERFICI EXTRAURBANE, RIPRISTINO E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ, SITO NEL COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO*TERRITORIO COMUNALE*INTERVENTO DI FORESTAZIONE E RIPRISTINO DI AREE PERCORSE DA INCENDIO PREVISTO SU HA 30.56.98	1.291.500,00 €
M2C4I3.1	G82F23000240001	INTERVENTO DI FORESTAZIONE NEL COMUNE DI NIZZA DI SICILIA*VIA TERRITORIO COMUNALE*INTERVENTO DI FORESTAZIONE NEL COMUNE DI NIZZA DI SICILIA	1.000.000,00 €
M2C4I3.1	H92F23000390006	PROGETTO DI FORESTAZIONE DI SUPERFICI EXTRAURBANE, RIPRISTINO E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ, SITO NEL COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA*C/DA IEMELLO*FORESTAZIONE DI SUPERFICI EXTRAURBANE, RIPRISTINO E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ, SITO NEL COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA	1.900.000,00 €
M2C4I3.1	B92F23000350001	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO. INTERVENTO DI FORESTAZIONE NELLE CITTÀ METROPOLITANE. COMUNE DI MALVAGNA.*BOSCO PITTARI*INTERVENTO DI FORESTAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MALVAGNA - CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA.	1.760.000,00 €
M2C4I3.1	F42F23000500006	PNRR M2C4 - I3.1 - AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO DI FORESTAZIONE URBANA, PERIURBANA ED EXTRAURBANA NELLE CITTÀ METROPOLITANE DEL 02/05/2023*PEZZOLO*INTERVENTO DI FORESTAZIONE URBANA DEL COMUNE DI MESSINA AREA BURGENSATICO DI PEZZOLO- 2° INTERVENTO	1.760.000,00 €
M2C4I3.1	D22F23000690007	TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITI NELLE CONTRADE BARATTA, STELLA E VORNA IN AGRO DEL COMUNE DI ALCARA LI FUSI.*CONTRADE BARATTA, STELLA, VORNA*PROGETTO PER L'IMBOSCHIMENTO E L'ACCRESIMENTO DEL VALORE ECOLOGICO E SOCIALE DI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE	1.079.184,90 €

M2C4I3.1	E72F23000590006	FORESTAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN FRATELLO*C.DA LINERI, PORTE, GIANFL...*INTERVENTI DI FORESTAZIONE	5.243.773,00 €
M2C3I1.1	B72C22000070006	DON ORIONE SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO G. GALILEI SITO IN VIA COLLODI NEL COMUNE DI SPADAFORA*VIA COLLODI*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO	5.814.586,95 €
M4C1I3.3	B42E20000150001	L.S.L.S. ARCHIMEDE*VIALE REGINA ELENA 3*LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E DEGLI IMPIANTI	8.810.195,74 €
M4C1I3.3	B41B20001030001	L.S. SEGUENZA*VIA S. AGOSTINO*LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E DEGLI IMPIANTI	4.085.000,00 €
M4C1I3.3	B41B20001040001	I.I.S. F. MAUROLICO*CORSO CAVOUR*LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E DEGLI IMPIANTI	4.703.000,00 €
M4C1I3.3	B41B20001050001	LICEO V. EMANUELE III*VIA TRIESTE 43*LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E DEGLI IMPIANTI	2.350.306,97 €
M4C1I3.3	B41B20001410002	I.I.S. VERONA TRENTO*VIA UGO BASSI*LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE OFFICINE E RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DI ISTRUZIONE SECONDARIA.	14.000.000,00 €
M4C1I3.3	B61B22000650006	L.S. E L. -CAMINITI TRIMARCHI - PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO CORPO PALESTRA, IN SOSTITUZIONE DI UN CAMPO SPORTIVO ALL'APERTO ESISTENTE.*BORGO MOSCATELLA*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE	1.859.200,00 €
M4C1I3.3	B41B22000930006	I.T.I.S. - EVANGELISTA TORRICELLI -PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO CORPO PALESTRA, DA REALIZZARE IN AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO.*VIA VALLONE POSTA, CIV. SNC*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE	1.859.000,00 €
M4C1I3.3	B49I22000120006	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA COPERTA ANNESSA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO QUASIMODO*VIALE GAZZI S.N.C.*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE	294.174,35 €
M4C1I3.3	B95E20004530006	I.I.S. LICEO C. CAMINITI*VIA CAMPO SPORTIVO*LAVORI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO, DEL NUOVO LICEO SCIENTIFICO	3.780.000,00 €

M4C1I3.3	B45E20004320006	I.T.A. CUPPARI - SEZ. ASSOCIATA I.S.MINUTOLI*VIA SP 35 C/DA SAN PLACIDO CALONERO*LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO PER LA FRUIZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELL'ITA CUPPARI - SAN PLACIDO CALONERO' DI IMPORTANZA STORICO ARTISTICA	5.105.000,00 €
M4C1I1.3	B41B22001050006	MESSINA I.S. BISAZZA PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO CORPO DA DESTINARSI A PALESTRA*VIALE ANNUNZIATA*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE	2.121.929,42 €
M4C1I1.2	B47G22000050006	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA DEL CONVITTO DELL'ISTITUTO AGRARIO CUPPARI, I.I.S. MINUTOLI*S.P. 35 KM.1.6*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	248.370,00 €
M5C2I2.3.2	F41B21000640001	RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI AMBITI DI RISANAMENTO DELLA ZONASUD DELLA CITTA' DI MESSINA DESTINATA ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE URBANA E ALLA DOTAZIONE DI SERVIZI*VIA BISCONTE FONDO FUCILE RIONE TAORMINA*RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI AMBITI DI RISANAMENTO DELLA ZONASUD DELLA CITTA' DI MESSINA DESTINATA ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE URBANA E ALLA DOTAZIONE DI SERVIZI	119.671.581,45 €
M5C2I2.2.C	B44D22000200006	COMPENDIO CITTA' DEL RAGAZZO*VIA PIETRO CASTELLI*PROGETTO PER LE OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPENDIO CITTA' DEL RAGAZZO DA DESTINARE A FINALITA' DI INCLUSIONE SOCIALE PROGETTO DOPO DI NOI.	55.660.265,99 €
M5C2I2.2.C	B47B22000040006	EX COLONIA IRIA*C/DA IRIA*PROGETTO PER LE OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA COMPREDENDO DEL COMPENDIO EX COLONIA IRIA CON IL RELATIVO RECUPERO EDILIZIO.	21.673.631,00 €
M5C2I2.2.C	B87B22000030006	COMPENDIO EX VILLAGGIO LE ROCCE*LOCALITA' MAZZARA' S.ANDREA VIA CASTELLUCCIO*PROGETTO PER LE OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA DEL COMENDIO EX VILLAGGIO LE ROCCE CON IL RELATIVO RECUPERO EDILIZIO.	7.551.408,00 €

M5C2I2.2.C	B42F22000090006	COMPENDIO EX I.A.I. E AREE DI PERTINENZA*VIA SAN PAOLO*PROGETTO PER LE OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA E RISTRUTTURAZIONE DEL COMPENDIO EX I.A.I. E DELLE AREE DI PERTINENZA.	13.936.588,00 €
M5C2I2.2.C	B42F22000100006	EX FONDERIA RAGNO*VIALE REGINA MARGHERITA*PROGETTO PER LE OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA COMPREDENDO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO EX FONDERIA RAGNO	2.230.921,01 €
M5C2I2.2.C	B44J22000030006	AREALE CAPO PELORO RICADENTE NEL SITO NATURA 2000 ZPSITA030042*VIA CIRCUITO*PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREALE CAPO PELORO RICADENTE NEL SITO NATURA 2000 ZPSITA030042.	10.000.000,00 €
M5C2I2.2.C	B41I22000040006	LARGO DIOGENE*LARGO DIOGENE*RIQUALIFICAZIONE URBANA DI LARGO DIOGENE FINALIZZATA A RESTITUIRE ALLA PUBBLICA FRUIZIONE UN'AREA SOTTRATTA AL DEGRADO.	1.000.000,00 €
M5C2I2.2.C	B41I22000050006	FONDO DE PASQUALE*FONDO DE PASQUALE*COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELLE AREE CIRCOSTANTI FONDO DE PASQUALE NEL COMUNE DI MESSINA.	600.000,00 €
M5C2I2.2.C	B41I22000060006	VIA DELLE MURA*VIA DELLE MURA*RIQUALIFICAZIONE URBANA COMPRESIVA DEL RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO DELL'ANTICA CINTA MURARIA DAZIARIA, SITA IN VIA DELLE MURA NEL COMUNE DI MESSINA.	500.000,00 €
M5C2I2.2.C	B41I22000070006	RIONE CAMARO*RIONE CAMARO*RIQUALIFICAZIONE URBANA FINALIZZATA A RESTITUIRE ALLA PUBBLICA FRUIZIONE UN'AREA SOTTRATTA AL DEGRADO, DEL RIONE DI CAMARO NEL COMUNE DI MESSINA.	3.000.000,00 €
M5C2I2.2.C	B41I22000080006	EX MAGAZZINI GAZZI*EZ MAGAZZINI GAZZI*INTERVENTO DI RICONVERSIONE DELL'INTERA AREA PUBBLICA DENOMINATA EX MAGAZZINI GAZZI PREVEDENDO LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE ATTUALI STRUTTURE EDILIZIE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI E SPAZI DI PERTINENZA, DA DESTINARE AL RICOLLOCAMENTO ABITATIVO.	16.000.000,00 €

Fonte: elaborazioni Cdc sulla base dei riscontri istruttori.

2.1 Avanzamento amministrativo

L'esame dell'avanzamento procedurale dei progetti di cui la Città Metropolitana di Messina è soggetto attuatore è stato effettuato attraverso il raffronto tra le informazioni fornite dall'Ente e quelle risultanti dalla piattaforma informatica ReGIS, all'interno della quale l'avanzamento procedurale viene identificato mediante l'associazione nel tempo ad ogni singolo CUP di una specifica fase della sequenza dei procedimenti amministrativi, rendendone così possibile il monitoraggio.

Le possibili fasi dell'attuazione sono così definite: "Progettazione esecutiva", "Pubblicazione bando di gara", "Aggiudicazione", "Stipula contratto", "Esecuzione lavori o Esecuzione fornitura", "Collaudo".

Il soggetto attuatore è responsabile del caricamento tempestivo su ReGIS della documentazione che attesti il completamento di ciascuna fase, condizione necessaria ai fini della rendicontazione finanziaria di ciascun progetto (ad esempio, il contratto tra ente e chi esegue l'opera attesta il completamento della fase di aggiudicazione oppure il certificato di conformità dei lavori o di collaudo attesta la conclusione del progetto).

In sede di riscontro istruttorio, per n. 10 interventi, appartenenti alla Missione 2, l'Ente aveva rappresentato che "il cono di visibilità esteso all'intervento è attivo dal mese di luglio 2024. Il cronoprogramma - iter di progetto non è stato implementato al 30/06/2024"; si trattava dei seguenti CUP: E62F23000250001; D12F23000490001; I32F23000420006; E32F23000340006; F82F23000590006; G82F23000240001; H92F23000390006; B92F23000350001; F42F23000500006; E72F23000590006.

Sul punto, nel riscontro alla bozza di referto, la Città Metropolitana di Messina riferisce che "ad oggi risultano avviati, come da relativa sezione crono programma - costi, sottosezione iter di progetto implementato in tutte le fasi obbligatorie di cui si allegano n. 10 schede iter di progetto, in formato editabile, estratte da ReGIS".

La Sezione ne prende atto.

Per n. 1 intervento - CUP I12F22000400006 - sempre relativo alla Missione 2, l'Ente non indicava alcuna fase procedurale.


In proposito, la Città Metropolitana riferisce che "sono state implementate le fasi procedurali nella sezione crono programma - costi, sottosezione iter di progetto di cui si allega n. 1 scheda iter di progetto, in formato editabile, estratta da ReGIS".

La Sezione ne prende atto.

Alla luce di quanto espresso, detti progetti erano stati indicati in una fase "n.d." -non determinata- e, in considerazione del fatto che sono stati comunque avviati in data posteriore a quella del

30/06/2024, scadenza ultima dell'attuale monitoraggio, la Sezione si riserva di valutarne l'andamento nelle successive fasi di verifica degli stati di avanzamento nell'attuazione del PNRR.

Ciò premesso, è stato elaborato il grafico che segue e che fornisce, in termini aggregati, lo stato di attuazione procedurale dei diversi interventi, mostrando le quote percentuali di ogni singola fase procedimentale/amministrativa:

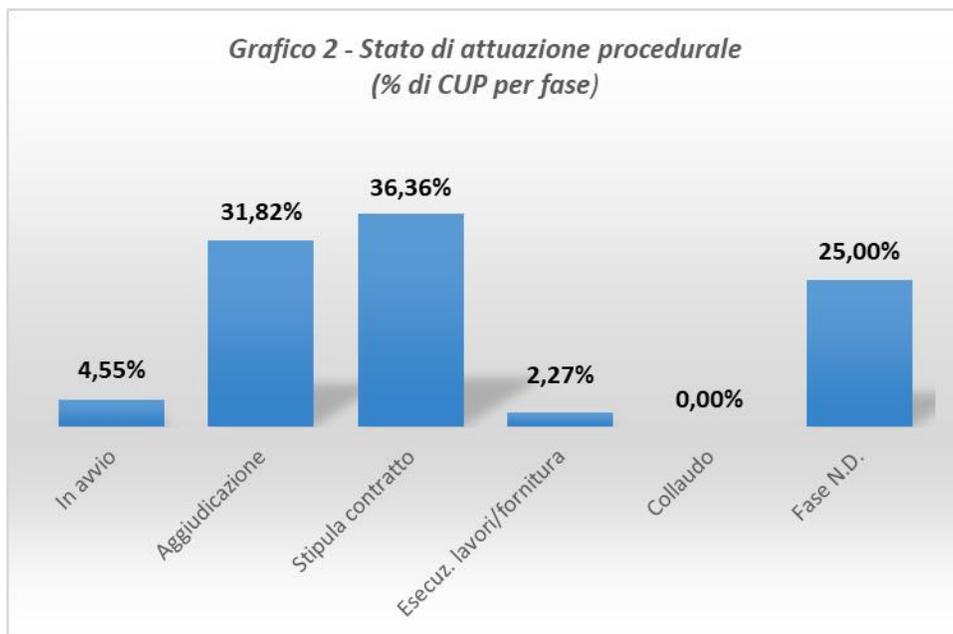

La Tabella 4, riporta, invece, l'indicazione della fase amministrativa, con scadenza al 30/6/2024, dei progetti della Città Metropolitana di Messina in funzione delle diverse missioni:

Tabella 4 - Avanzamento procedurale

Missione	In avvio	Aggiudicazione	Stipula contratto	Esecuz. Lavori/Fornitura	Collaudo	Fase N.D.	Somma CUP
totale M2	1	2	5	1		11	20
totale M4	1	1	10				12
totale M5		11	1				12

Fonte: elaborazioni Cdc sulla base dei riscontri istruttori.

Si osserva come la maggior parte dei CUP appartengano alla Missione 2 e, di questi, per n. 11 non sia stata implementata la fase procedurale, perché avviati in una data successiva al 30 giugno 2024 (v. sopra).

Per gli interventi appartenenti alle altre Missioni: n. 10 CUP della Missione 4 sono in fase di "stipula contratto" con un soggetto aggiudicatario, mentre la maggior parte dei progetti relativi alla Missione 5, sono ancora in fase di "aggiudicazione".

Gli interventi finanziati con i fondi del PNRR seguono un cronoprogramma predefinito a livello nazionale.⁵

La “Tabella 4 bis” mostra la percentuale di CUP in linea con il cronoprogramma della Città Metropolitana di Messina. Dal riscontro dell’Ente e da estrazione ReGIS è emerso come - prescindendo dai progetti per i quali non è stato possibile verificare la fase di avanzamento procedimentale (v. sopra) - alla data del 30/6/2024, i progetti dell’Ente siano allineati al cronoprogramma:

Tabella 4 bis- Cronoprogramma

Missione	In avvio	Aggiudicazione	Stipula contratto	Esecuz. Lavori/Fornitura	Collaudo	% CUP in linea con cronoprogramma
totale M2	1	2	5	1		100,00%
totale M4	1	1	10			100,00%
totale M5		11	1			100,00%

Fonte: elaborazioni Cdc sulla base dei riscontri istruttori.

Nella Tabella 5 è rappresentato, in dettaglio, lo stato di avanzamento di ogni singolo progetto:

Tabella 5 - Elenco dei progetti per stato di attuazione

Missione - Componente - Investimento	CUP	Denominazione progetto	Fase procedurale
M2C4I3.1	F42F22000520006	COMUNE DI MESSINA*PROVINCIALE 35*INTERVENTO DI FORESTAZIONE URBANA DEL COMUNE DI MESSINA AREA BURGENSATICO DI PEZZOLO	ESECUZIONE LAVORI

⁵Per quanto concerne il cronoprogramma, il decreto del MEF del 6 agosto 2021 (“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per il PNRR – DM ripartizione traguardi e obiettivi”) definisce la data entro la quale gli interventi devono essere conclusi, mentre gli accordi operativi (“Operational Arrangements”), firmati dal Ministro Franco il 23-12- 2021 e condivisi dall’Italia con la Commissione Europea, stabiliscono le scadenze delle diverse fasi di ciascun intervento del piano (https://commission.europa.eu/system/files/2021-12/countersigned_-_italy_-_rrf_-_oa_1.pdf).

M2C4I3.1	E32F22000290006	INTERVENTO DI IMBOSCHIMENTO CON FINALITÀ PROTETTIVE DA RISCHIO IDROGEOLOGICO IN CONTRADA PUZZO DEL COMUNE DI ALÌ*CONTRADA PUZZO*INTERVENTO DI IMBOSCHIMENTO CON FINALITÀ PROTETTIVE DA RISCHIO IDROGEOLOGICO IN CONTRADA PUZZO DEL COMUNE DI ALÌ	STIPULA CONTRATTO
M2C4I3.1	F82F22000720006	PROGETTO DI FORESTAZIONE DI SUPERFICI EXTRAURBANE, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO, PER LA PREVENZIONE, RIPRISTINO E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ*VIA TERRITORIO COMUNALE MONTANO*INTERVENTO DI FORESTAZIONE E RIPRISTINO DI AREE PERCORSE DA INCENDIO PREVISTA IN 53.21.20 ETTARI	STIPULA CONTRATTO
M2C4I3.1	I12F22000400006	INTERVENTO DI FORESTAZIONE URBANA PERIURBANA ED EXTRAURBANA NEL COMUNE DI OLIVERI DENOMINATO: RESPIRA OLIVERI*VIA TERRITORIO DEL COMUNE DI OLIVERI*INTERVENTO DI FORESTAZIONE URBANA PERIURBANA ED EXTRAURBANA NEL COMUNE DI OLIVERI	NON DETERMINATA
M2C4I3.1	F42F22000470006	FORESTAZIONE DI SUPERFICI EXTRAURBANE, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LIBRIZZI, PER LA PREVENZIONE, RIPRISTINO E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ, CON FINALITÀ PRINCIPALMENTE CLIMATICO-AMBIENTALE, PROTETTIVE, PAESAGGISTICHE E SOCIALI*CAVALLAZZO ECC*FORESTAZIONE DI SUPERFICI EXTRAURBANE, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LIBRIZZI, PER LA PREVENZIONE, RIPRISTINO E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ, CON FINALITÀ PRINCIPALMENTE CLIMATICO-AMBIENTALE, PROTETTIVE, PAESAGGISTICHE E SOCIALI	STIPULA CONTRATTO
M2C4I3.1	J82F22000460006	CASTROREALE GREEN GREEN	STIPULA CONTRATTO

M2C4I3.1	C62F22000520006	TERRITORIO MONTANO COMUNALE CCR CORRIDOIO ECOLOGICO - STRADE CITTADINE PARCO URBANO AREA PIP ZONE ADIACENTI CAMPO SPORTIVO*ZONA MONTANA E AREE URBANE*FORESTAZIONE URBANA ED EXTRAURBANA	STIPULA CONTRATTO
M2C4I3.1	D22F22000640006	INTERVENTI DI FORESTAZIONE NEL COMPENSORIO DELLA VALLE DELL'ALCANTARA*LOCALITÀ VARIE*INTERVENTI DI FORESTAZIONE DA REALIZZARSI NEL COMPENSORIO DELLA VALLE DELL'ALCANTARA NEI COMUNI DI FRANCAVILLA DI SICILIA, GAGGI, GIARDINI NAXOS, GRANITI, MALVAGNA, MOIO ALCANTARA, MOTTA CAMASTRA E TAORMINA	AGGIUDICAZIONE
M2C4I3.1	E62F23000250001	COMUNE DI MILITELLO ROSMARINO (ME)*FOGLIO 1 PART. 112; FOGLIO 3 PARTT. 39 E 51; FOGLIO 9 PARTT. 17 E 283.*INTERVENTO DI RIMBOSCHIMENTO IN AREE URBANE	NON DETERMINATA
M2C4I3.1	D12F23000490001	INTERVENTO DI FORESTAZIONE URBANA, PERIURBANA ED EXTRAURBANA DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR, MISURA 2 COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO" - COMUNI DI VILLAFRANCA TIRRENA E SAPONARA*SERRO*RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE CON INTERVENTO DI RIMBOSCHIMENTO	NON DETERMINATA

M2C4I3.1	I32F23000420006	<p>PROGETTO DI FORESTAZIONE DI SUPERFICI EXTRAURBANE, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TUSA, PER LA PREVENZIONE, RIPRISTINO E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ, CON FINALITÀ PRINCIPALMENTE CLIMATICO-AMBIENTALE, PROTETTIVE, PAESAGGISTICHE E SOCIALI.*TARDARA*</p> <p>PROGETTO DI FORESTAZIONE DI SUPERFICI EXTRAURBANE, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TUSA, PER LA PREVENZIONE, RIPRISTINO E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ, CON FINALITÀ PRINCIPALMENTE CLIMATICO-AMBIENTALE, PROTETTIVE, PAESAGGISTICHE E SOCIALI.</p>	NON DETERMINATA
M2C4I3.1	E32F23000340006	<p>INTERVENTO DI IMBOSCHIMENTO CON FINALITÀ PROTETTIVE DA RISCHIO IDROGEOLOGICO IN CONTRADA PUZZO-GABBIA ALLE PENDICI DI MONTE SCUDERI NEL COMUNE DI ALÌ</p> <p>*CONTRADA PUZZO/GABBIA*</p> <p>IMBOSCHIMENTO CON FINALITÀ PROTETTIVE DA RISCHIO IDROGEOLOGICO IN CONTRADA PUZZO-GABBIA ALLE PENDICI DI MONTE SCUDERI NEL COMUNE DI ALÌ</p>	NON DETERMINATA
M2C4I3.1	F82F23000590006	<p>PROGETTO DI FORESTAZIONE DI SUPERFICI EXTRAURBANE, RIPRISTINO E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ, SITO NEL COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO*</p> <p>TERRITORIO COMUNALE*</p> <p>INTERVENTO DI FORESTAZIONE E RIPRISTINO DI AREE PERCORSE DA INCENDIO PREVISTO SU HA 30.56.98</p>	NON DETERMINATA
M2C4I3.1	G82F23000240001	<p>INTERVENTO DI FORESTAZIONE NEL COMUNE DI NIZZA DI SICILIA*</p> <p>VIA TERRITORIO COMUNALE*</p> <p>INTERVENTO DI FORESTAZIONE NEL COMUNE DI NIZZA DI SICILIA</p>	NON DETERMINATA

M2C4I3.1	H92F23000390006	PROGETTO DI FORESTAZIONE DI SUPERFICI EXTRAURBANE, RIPRISTINO E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ, SITO NEL COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA*C/DA IEMELLO*FORESTAZIONE DI SUPERFICI EXTRAURBANE, RIPRISTINO E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ, SITO NEL COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA	NON DETERMINATA
M2C4I3.1	B92F23000350001	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO. INTERVENTO DI FORESTAZIONE NELLE CITTÀ METROPOLITANE. COMUNE DI MALVAGNA.*BOSCO PITTARI*INTERVENTO DI FORESTAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MALVAGNA - CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA.	NON DETERMINATA
M2C4I3.1	F42F23000500006	PNRR M2C4 - I3.1 - AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO DI FORESTAZIONE URBANA, PERIURBANA ED EXTRAURBANA NELLE CITTÀ METROPOLITANE DEL 02/05/2023*PEZZOLO*INTERVENTO DI FORESTAZIONE URBANA DEL COMUNE DI MESSINA AREA BURGENSATICO DI PEZZOLO-2° INTERVENTO	NON DETERMINATA
M2C4I3.1	D22F23000690007	TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITI NELLE CONTRADE BARATTA, STELLA E VORNA IN AGRO DEL COMUNE DI ALCARA LI FUSI.*CONTRADE BARATTA, STELLA, VORNA*PROGETTO PER L'IMBOSCHIMENTO E L'ACCRESIMENTO DEL VALORE ECOLOGICO E SOCIALE DI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE	IN AVVIO
M2C4I3.1	E72F23000590006	FORESTAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN FRATELLO*C.DA LINERI, PORTE, GIANFLI...*INTERVENTI DI FORESTAZIONE	NON DETERMINATA

M2C3I1.1	B72C22000070006	DON ORIONE SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO G. GALILEI SITO IN VIA COLLODI NEL COMUNE DI SPADAFORA*VIA COLLODI*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO	AGGIUDICAZIONE
M4C1I3.3	B42E20000150001	L.S.L.S. ARCHIMEDE*VIALE REGINA ELENA 3*LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E DEGLI IMPIANTI	AGGIUDICAZIONE
M4C1I3.3	B41B20001030001	L.S. SEGUENZA*VIA S. AGOSTINO*LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E DEGLI IMPIANTI	STIPULA CONTRATTO
M4C1I3.3	B41B20001040001	I.I.S. F. MAUROLICO*CORSO CAVOUR*LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E DEGLI IMPIANTI	STIPULA CONTRATTO
M4C1I3.3	B41B20001050001	LICEO V. EMANUELE III*VIA TRIESTE 43*LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E DEGLI IMPIANTI	STIPULA CONTRATTO
M4C1I3.3	B41B20001410002	I.I.S. VERONA TRENTO*VIA UGO BASSI*LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE OFFICINE E RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DI ISTRUZIONE SECONDARIA.	IN AVVIO
M4C1I3.3	B61B22000650006	L.S. E L. -CAMINITI TRIMARCHI - PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO CORPO PALESTRA, IN SOSTITUZIONE DI UN CAMPO SPORTIVO ALL'APERTO ESISTENTE.*BORGO MOSCATELLA*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE	STIPULA CONTRATTO
M4C1I3.3	B41B22000930006	I.T.I.S. - EVANGELISTA TORRICELLI - PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO CORPO PALESTRA, DA REALIZZARE IN AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO.*VIA VALLONE POSTA, CIV. SNC*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE	STIPULA CONTRATTO
M4C1I3.3	B49I22000120006	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA COPERTA ANNESSA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO QUASIMODO*VIALE GAZZI S.N.C.*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE	STIPULA CONTRATTO

M4C1I3.3	B95E20004530006	I.I.S. LICEO C. CAMINITI*VIA CAMPO SPORTIVO*LAVORI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO, DEL NUOVO LICEO SCIENTIFICO	STIPULA CONTRATTO
M4C1I3.3	B45E20004320006	I.T.A. CUPPARI - SEZ. ASSOCIATA I.S.MINUTOLI*VIA SP 35 C/DA SAN PLACIDO CALONERO*LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO PER LA FRUIZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELL'ITA CUPPARI - SAN PLACIDO CALONERO' DI IMPORTANZA STORICO ARTISTICA	STIPULA CONTRATTO
M4C1I1.3	B41B22001050006	MESSINA I.S. BISAZZA PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO CORPO DA DESTINARSI A PALESTRA*VIALE ANNUNZIATA*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE	STIPULA CONTRATTO
M4C1I1.2	B47G22000050006	ADEGUAMENTO E MESSA INSICUREZZA DELLA MENSA DEL CONVITTO DELL'ISTITUTO AGRARIO CUPPARI, I.I.S. MINUTOLI*S.P. 35 KM.1.6*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	STIPULA CONTRATTO
M5C2I2.3.2	F41B21000640001	RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI AMBITI DI RISANAMENTO DELLA ZONASUD DELLA CITTA' DI MESSINA DESTINATA ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE URBANA E ALLA DOTAZIONE DI SERVIZI*VIA BISCONTE FONDO FUCILE RIONE TAORMINA*RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI AMBITI DI RISANAMENTO DELLA ZONASUD DELLA CITTA' DI MESSINA DESTINATA ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE URBANA E ALLA DOTAZIONE DI SERVIZI	STIPULA CONTRATTO
M5C2I2.2.C	B44D22000200006	COMPENDIO CITTA' DEL RAGAZZO*VIA PIETRO CASTELLI*PROGETTO PER LE OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPENDIO CITTA' DEL RAGAZZO DA DESTINARE A FINALITA' DI INCLUSIONE SOCIALE PROGETTO DOPO DI NOI.	AGGIUDICAZIONE
M5C2I2.2.C	B47B22000040006	EX COLONIA IRIA*C/DA IRIA*PROGETTO PER LE OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA COMPRENDENDO DEL COMPENDIO EX COLONIA IRIA CON IL RELATIVO RECUPERO EDILIZIO.	AGGIUDICAZIONE

M5C2I2.2.C	B87B22000030006	COMPENDIO EX VILLAGGIO LE ROCCE*LOCALITA' MAZZARA' S.ANDREA VIA CASTELLUCCIO*PROGETTO PER LE OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA DEL COMENDIO EX VILLAGGIO LE ROCCE CON IL RELATIVO RECUPERO EDILIZIO.	AGGIUDICAZIONE
M5C2I2.2.C	B42F22000090006	COMPENDIO EX I.A.I. E AREE DI PERTINENZA*VIA SAN PAOLO*PROGETTO PER LE OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA E RISTRUTTURAZIONE DEL COMPENDIO EX I.A.I. E DELLE AREE DI PERTINENZA.	AGGIUDICAZIONE
M5C2I2.2.C	B42F22000100006	EX FONDERIA RAGNO*VIALE REGINA MARGHERITA*PROGETTO PER LE OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA COMPRENDENDO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO EX FONDERIA RAGNO	AGGIUDICAZIONE
M5C2I2.2.C	B44J22000030006	AREALE CAPO PELORO RICADENTE NEL SITO NATURA 2000 ZPSITA030042*VIA CIRCUITO*PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREALE CAPO PELORO RICADENTE NEL SITO NATURA 2000 ZPSITA030042.	AGGIUDICAZIONE
M5C2I2.2.C	B41I22000040006	LARGO DIOGENE*LARGO DIOGENE*RIQUALIFICAZIONE URBANA DI LARGO DIOGENE FINALIZZATA A RESTITUIRE ALLA PUBBLICA FRUIZIONE UN'AREA SOTTRATTA AL DEGRADO.	AGGIUDICAZIONE
M5C2I2.2.C	B41I22000050006	FONDO DE PASQUALE*FONDO DE PASQUALE*COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELLE AREE CIRCOSTANTI FONDO DE PASQUALE NEL COMUNE DI MESSINA.	AGGIUDICAZIONE
M5C2I2.2.C	B41I22000060006	VIA DELLE MURA*VIA DELLE MURA*RIQUALIFICAZIONE URBANA COMPRESIVA DEL RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO DELL'ANTICA CINTA MURARIA DAZIARIA, SITA IN VIA DELLE MURA NEL COMUNE DI MESSINA.	AGGIUDICAZIONE
M5C2I2.2.C	B41I22000070006	RIONE CAMARO*RIONE CAMARO*RIQUALIFICAZIONE URBANA FINALIZZATA A RESTITUIRE ALLA PUBBLICA FRUIZIONE UN'AREA SOTTRATTA AL DEGRADO, DEL RIONE DI CAMARO NEL COMUNE DI MESSINA.	AGGIUDICAZIONE

M5C2I2.2.C	B41I22000080006	EX MAGAZZINI GAZZI*EZ MAGAZZINI GAZZI*INTERVENTO DI RICONVERSIONE DELL'INTERA AREA PUBBLICA DENOMINATA EX MAGAZZINI GAZZI PREVEDENDO LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE ATTUALI STRUTTURE EDILIZIE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI E SPAZI DI PERTINENZA, DA DESTINARE AL RICOLLOCAMENTO ABITATIVO.	AGGIUDICAZIONE
------------	-----------------	---	----------------

Fonte: elaborazioni Cdc sulla base dei riscontri istruttori.

2.2 Avanzamento finanziario

Con la nota istruttoria prot. Cdc n. 4398 del 04/06/2024, questa Sezione ha chiesto alla Città Metropolitana di Messina per ciascun progetto identificato mediante CUP, di indicare l'importo totale degli accertamenti, degli impegni e dei pagamenti al 31/12/2023, con aggiornamento al 30/06/2024.

In merito agli accertamenti, va richiamata la disposizione contenuta nell'art. 15 del d.l. 77/2021 la quale, al fine di accelerare l'avvio degli interventi, ha previsto che gli enti attuatori possano accertare nel loro bilancio le risorse finanziarie che sono loro attribuite dal PNRR su specifici capitoli di spesa, già dalla data del decreto o atto di riparto, ovvero, ancora prima che le risorse risultino impegnate dall'amministrazione centrale titolare dell'intervento. Questa norma ha consentito di derogare alle regole ordinarie fissate dal principio contabile applicato 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011, anticipando il momento in cui diviene possibile contabilizzare l'accertamento in entrata necessario alla copertura finanziaria della correlata spesa.

Inoltre, poiché nel PNRR l'avvio dei progetti precede il finanziamento, per gli enti che non abbiano capienza finanziaria sufficiente per avviare gli investimenti, il d.l. n. 152/2021, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", prevede all'art. 9, commi 6 e 7, la possibilità di disporre di anticipazioni di liquidità (nella misura del 10 per cento delle risorse complessive assegnate) su un fondo di rotazione del MEF a gestione speciale da destinare ai soggetti attuatori dei progetti, sulla base di motivate richieste presentate dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi ricompresi nel PNRR. La contabilizzazione di questi anticipi è normata dal comma 6 dello stesso articolo dove si legge: "per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR".

Nel suo riscontro, l'Ente ha fornito informazioni relative allo stato di avanzamento finanziario di ciascun progetto.

All'esito dell'attività istruttoria, la Sezione aveva acquisito lo stato delle risorse accertate, degli impegni e dei pagamenti così come riferiti dalla Città Metropolitana di Messina, oltre che il dato relativo ai fondi richiesti e ottenuti dall'Ente in forma di anticipazione.

Le informazioni venivano riassunte in forma aggregata per Missione nella seguente tabella:

Tabella 6 - Anticipazioni, accertamenti, impegni e pagamenti

Missione	N. CUP	Totale finanziamento (€)	Anticipazione (€)	Accertamenti (€)	Impegni (€)	Pagamenti (€)	Pagamenti su accertamenti
totale M2	20	43.282.308,98 €	1.986.296,61 €	23.297.207,32 €	7.400.883,56 €	1.978.906,13 €	8,49%
totale M4	12	49.216.176,48 €	8.840.028,38 €	35.833.866,53 €	35.470.008,94 €	3.215.530,63 €	8,97%
totale M5	12	251.824.395,45 €	23.176.071,81 €	187.113.604,41 €	142.113.604,41 €	11.364.286,58 €	6,07%
totale		344.322.880,91 €	34.002.396,80 €	246.244.678,26 €	184.984.496,91 €	16.558.723,34 €	6,72%

Fonte: elaborazioni Cdc sulla base dei riscontri istruttori.

La Tabella 6 mostrava il finanziamento totale, ovvero le risorse a disposizione dell'Ente per attuare i progetti del PNRR: le risorse complessive sono costituite, come già esplicitato, dalla somma dei fondi RRF e PNC, da altri finanziamenti pubblici, come, ad esempio, i fondi FOI e i fondi tratti dal bilancio dell'Ente.

In sede di riscontro, la Città Metropolitana di Messina ha rielaborato la superiore tabella, aggiornando i dati complessivi riferiti alle anticipazioni, agli accertamenti, agli impegni e ai pagamenti al 30/01/2025:

Missione	N.CUP	Totale finanziamento €	Anticipazione €	Accertamenti €	Rate intermedie €	Impegni €	Pagamenti €
totale M2	20	43.282.308,98	5.958.889,84	41.841.487,86	592.191,30	7.400.883,56	1.978.906,13
totale M4	12	49.216.176,48	11.730.160,04	49.216.176,48	-	35.482.508,94	5.785.205,36
totale M5	12	251.824.395,45	36.418.406,61	186.760.821,24	-	142.113.604,41	15.737.202,97
totale	44	344.322.880,91	54.107.456,49	277.818.485,58	592.191,30	184.996.996,91	23.501.314,46

Nel merito, precisa che "per n. 8 interventi relativi alla Missione 2, l'Amministrazione Titolare nel mese di dicembre 2024, ha trasferito l'integrazione dell'anticipazione fino alla concorrenza del 30% a seguito della pubblicazione in GURI -Serie Generale n. 52 del 02.03.2024 del Decreto - Legge 2 marzo 2024 n. 19 - ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); parimenti, per n. 2 interventi afferenti la Missione 2, sempre nel mese di dicembre 2024, sono stati approvati rendiconti di spesa per complessivi € 645.052,48 ed erogate somme a rendiconto per rate intermedie per complessivi € 592.191,30.

La differenza pari ad € 52.861,18, è in fase di verifica sostanziale da parte dell'A.T., propedeutica all'erogazione".

La Sezione ne prende atto.

Per quanto concerne gli accertamenti, che rappresentavano il 71,52 per cento del totale dei finanziamenti, la Sezione rilevava che, per il CUP G82F23000240001 - M2C4I3.1, la Città Metropolitana di Messina riferiva che "l'importo complessivo del progetto pari ad €1.000.000,00 è stato accertato per la quota parte del 10% nell'anno 2024", ma inseriva, nella scheda di riscontro istruttorio, l'intera quota finanziata dai fondi PNRR: si chiedeva all'Ente di verificare.

Sul punto, in sede di riscontro, la Città Metropolitana di Messina riferisce che "l'accertamento è stato effettuato con due distinte determinazioni. La prima con cui è stato accertato il 10%; la seconda con cui è stato accertato il rimanente 90%" e allega le rispettive determinazioni dirigenziali di accertamento.

La Sezione ne prende atto.

In riferimento agli impegni e ai pagamenti, era stato rilevato che la Città Metropolitana non aveva fornito detti importi per tutti i progetti della Missione 2 per i quali aveva rappresentato che "il cono di visibilità esteso all'intervento è attivo dal mese di luglio 2024. Il cronoprogramma - iter di progetto non è stato implementato al 30/06/2024": si chiedeva all'Ente di fornire le informazioni mancanti.

In fase di risposta alla bozza di referto, l'Amministrazione rappresenta che "sono stati effettuati gli accertamenti, anche in questo caso con due distinte determinazioni; la prima con cui è stato accertato il 10%; la seconda con cui è stato accertato il rimanente 90%" e allega le rispettive determinazioni dirigenziali. Aggiunge che "per tali interventi in atto non è stata richiesta anticipazione all'Amministrazione Titolare (MASE). In conseguenza non sono ancora stati effettuati impegni e pagamenti.

Con riferimento agli impegni di spesa di cui agli interventi afferenti alla Missione 2 di cui sopra, si rappresenta che con Decreto Sindacale n. 9 del 28/01/2025 è stato approvato il prospetto relativo all'avanzo presunto di amministrazione per l'applicazione delle quote vincolate del risultato di amministrazione al 31/12/2024 nelle more dell'approvazione del rendiconto di gestione 2024 - art. 187 comma 3 quater decreto lgs. 18 agosto 2000. In conseguenza di ciò si procederà all'impegno delle somme relative agli interventi afferenti alla Missione 2".

La Sezione ne prende atto.

Relativamente ai soli pagamenti, inoltre, la Sezione ne segnalava una modesta percentuale, pari al 6,72 per cento, rispetto alle somme accertate e, in particolare, evidenziava l'esiguità degli importi che sono stati indicati dall'Ente nelle schede di riscontro per alcuni progetti, di seguito specificati:

- CUP B47B22000040006 - M5C2I2.2.C - EX COLONIA IRIA*C/DA IRIA*PROGETTO PER LE OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA COMPRENDENDO DEL COMPENDIO EX COLONIA IRIA CON IL RELATIVO RECUPERO EDILIZIO - pagamenti per euro 91,08, a fronte di accertamenti pari a euro 21.673.631,00;

- CUP B42F22000090006 - M5C2I2.2.C - COMPENDIO EX I.A.I. E AREE DI PERTINENZA*VIA SAN PAOLO*PROGETTO PER LE OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA E RISTRUTTURAZIONE DEL COMPENDIO EX I.A.I. E DELLE AREE DI PERTINENZA- pagamenti per euro 936,10, a fronte di accertamenti pari a euro 13.936.588,00;

- CUP B42F22000100006 - M5C2I2.2.C - EX FONDERIA RAGNO*VIALE REGINA MARGHERITA*PROGETTO PER LE OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA COMPRENDENDO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO EX FONDERIA RAGNO - pagamenti per euro 32,87, a fronte di accertamenti pari a euro 2.230.921,00;

- CUP B44J22000030006 - M5C2I2.2.C - AREALE CAPO PELORO RICADENTE NEL SITO NATURA 2000 ZPSITA030042*VIA CIRCUITO*PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREALE CAPO PELORO RICADENTE NEL SITO NATURA 2000 ZPSITA030042 - pagamenti per euro 48,39, a fronte di accertamenti pari a euro 10.000.000,00;

- CUP B41I22000040006 - M5C2I2.2.C - LARGO DIOGENE*LARGO DIOGENE*RIQUALIFICAZIONE URBANA DI LARGO DIOGENE FINALIZZATA A RESTITUIRE ALLA PUBBLICA FRUIZIONE UN'AREA SOTTRATTA AL DEGRADO - pagamenti per euro 5,26, a fronte di accertamenti pari a euro 300.000,00;

- CUP B41I22000050006 - M5C2I2.2.C - FONDO DE PASQUALE*FONDO DE PASQUALE*COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELLE AREE CIRCOSTANTI FONDO DE PASQUALE NEL COMUNE DI MESSINA - pagamenti per euro 22,79, a fronte di accertamenti pari a euro 1.300.000,00;

- CUP B41I22000060006 - M5C2I2.2.C - VIA DELLE MURA*VIA DELLE MURA*RIQUALIFICAZIONE URBANA COMPRENSIVA DEL RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO DELL'ANTICA CINTA MURARIA DAZIARIA, SITA IN VIA DELLE MURA NEL COMUNE DI MESSINA- pagamenti per euro 8,33, a fronte di accertamenti pari a euro 500.000,00;

- CUP B41I22000070006 - M5C2I2.2.C - RIONE CAMARO*RIONE CAMARO*RIQUALIFICAZIONE URBANA FINALIZZATA A RESTITUIRE ALLA PUBBLICA FRUIZIONE UN'AREA SOTTRATTA AL DEGRADO, DEL RIONE DI CAMARO NEL COMUNE DI MESSINA- pagamenti per euro 64,00, a fronte di accertamenti pari a euro 3.000.000,00;

- CUP B41I22000080006 - M5C2I2.2.C - EX MAGAZZINI GAZZI*EZ MAGAZZINI GAZZI*INTERVENTO DI RICONVERSIONE DELL'INTERA AREA PUBBLICA DENOMINATA EX MAGAZZINI GAZZI PREVEDENDO LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE ATTUALI STRUTTURE EDILIZIE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI E SPAZI DI PERTINENZA, DA DESTINARE AL RICOLLOCAMENTO ABITATIVO - pagamenti per euro 82,66, a fronte di accertamenti pari a euro 16.000.000,00.

La Sezione chiedeva dettagli in merito.

Sul punto, in sede di riscontro alla bozza di referto, la Città Metropolitana di Messina rileva che l'Ente *"ha aderito, con specifiche determinate a contrarre, agli Accordi Quadro indetti da Invitalia per l'acquisizione degli operatori economici relativamente ai sub-lotti prestazionali per servizi tecnici di progettazione definitiva, verifica della progettazione, appalto integrato e collaudo.*

In particolare, le procedure pubblicate da Invitalia hanno riguardano i seguenti 4 Accordi Quadro multilaterali:

- 1. affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura per la ristrutturazione, la manutenzione e la rifunionalizzazione ecosostenibile di strutture edilizie pubbliche esistenti.*
- 2. affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura per la rifunionalizzazione ecosostenibile di aree e spazi pubblici.*
- 3. affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura per il restauro, la ristrutturazione, la manutenzione e la rifunionalizzazione ecosostenibile di strutture edilizie pubbliche esistenti sottoposte a tutela.*
- 4. affidamento per l'affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura per la realizzazione di interventi afferenti alla mobilità, inclusa quella ciclabile.*

Invitalia ha aggiudicato e stipulato gli Accordi Quadro con gli appaltatori per ogni specifica tipologia di prestazione (progettazione definitiva con direzione lavori; verifica della progettazione; lavori per appalto integrato; collaudo).

Questo Soggetto Attuatore ha proceduto all'attivazione degli specifici appaltatori, per la progettazione definitiva, della verifica della progettazione e, a conclusione con esito positivo del rapporto di verifica sul progetto definitivo, all'attivazione dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione lavori.

Le tempistiche per l'acquisizione delle progettazioni definitive e per il successivo rilascio pareri in conferenza dei servizi per la relativa approvazione hanno subito alcuni ritardi dovuti anche alla complessità, in taluni casi, delle attività di indagine propedeutiche alla stessa progettazione, oltre che all'interpretazione dell'evoluzione normativa, anche a seguito dell'emanazione del D.lgs. 36/2023 del 31/03/2023 per il rilascio dei pareri da parte degli Enti preposti: a seguito dell'istituzione della Cabina di Coordinamento presso la Prefettura di Messina, ai sensi dell'art. 9 D.L. 2 marzo 2024 n. 19, S.E. il Prefetto ha contribuito a risolvere le criticità in materia di

rilascio pareri da parte di alcuni Enti preposti, attivando il coordinamento con le Amministrazioni Titolari e con gli Enti preposti per la definizione degli iter amministrativi ed autorizzativi finalizzati al rispetto delle tempistiche dei crono programmi degli interventi.

Per quanto sopra, i pagamenti al 30/06/2024 risultavano allineati a quanto indicato da Codesta Sezione nella bozza di referto.

Ad oggi, l'aggiornamento dei pagamenti relativamente ai CUP segnalati, viene di seguito riportato:

- B47B22000040006: importo pagamenti pari ad € 206.344,11;
- B42F22000090006: importo pagamenti pari ad € 1.636,10;
- B42F22000100006: importo pagamenti pari ad € 542,87;
- B44J22000030006: si conferma l'importo pagamenti come da bozza referto;
- B41I22000040006: si conferma l'importo pagamenti come da bozza referto;
- B41I22000050006: si conferma l'importo pagamenti come da bozza referto;
- B41I22000060006: importo pagamenti pari ad € 11.639,69;
- B41I22000070006: si conferma l'importo pagamenti come da bozza referto;
- B41I22000080006: importo pagamenti pari ad € 29.690,58.

Infine, la tabella 6 sviluppata nella bozza di referto mostrava come le anticipazioni ammontassero ad euro 34.002.396,80 e costituissero il 9,88 per cento delle risorse finanziate.

A tal proposito, in fase di riscontro, la Città Metropolitana attualizzando il dato sempre al 30/01/2025, riferisce che *“le anticipazioni ammontano ad € 54.107.456,49, oltre € 592.191,30 per rate intermedie rendicontate ed incassate”*.

La Sezione prende atto di quanto dichiarato dall'Ente ma ribadisce che per tutte le informazioni fornite dall'Amministrazione e riferite a data posteriore al 30/06/2024, la Sezione si riserva di riscontrarle nelle successive fasi di verifica degli stati di avanzamento nell'attuazione del PNRR.

2.3 Progetti rimodulati

In considerazione delle modifiche intervenute rispetto all'originaria configurazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza⁶, con la nota istruttoria prot. Cdc n. 4398 del 04/06/2024, questa

⁶ In merito alla rimodulazione del PNRR, si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, D.L. 2/3/2024, n. 19, convertito con l. 29/4/2024, n. 56 (G.U. n. 100 del 30/4/2024 - Suppl. Ordo. N. 19): *“Al fine di garantire una più efficiente e coordinata utilizzazione delle risorse europee e del bilancio dello Stato e consentire la tempestiva realizzazione degli investimenti stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi previsti dallo stesso Piano, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 2.911 milioni di euro per l'anno 2024, 3.973 milioni di euro per l'anno 2025 e 2.536 milioni di euro per l'anno 2026. Per la realizzazione degli investimenti non più*

Sezione ha chiesto alla Città Metropolitana di Messina di comunicare, per ciascun intervento identificato da un CUP, se il costo del progetto avesse subito rimodulazioni e, in caso affermativo, di spiegarne la motivazione.

Dal riscontro istruttorio, l'Ente rappresentava che il costo iniziale di n. 5 progetti era stato rimodulato.

Per n. 2 interventi appartenenti alla Missione 5, ne dettagliava le motivazioni come segue:

- CUP B41I22000040006 - M5C2I2.2.C - LARGO DIOGENE*LARGO DIOGENE * RIQUALIFICAZIONE URBANA DI LARGO DIOGENE FINALIZZATA A RESTITUIRE ALLA PUBBLICA FRUIZIONE UN'AREA SOTTRATTA AL DEGRADO – costo totale del progetto 300.000 euro, per il quale l'Amministrazione riferisce “Nota Ministeriale prot. n. 28372/24 del 12.03.2024 - Decreto 12.06.2024: Rettifica ed integrazione al decreto 26 giugno 2023, con definizione delle fonti di finanziamento PUI - PNRR e PUI - Nazionale per le singole progettualità - Incremento dell'importo con ammontare del progetto pari ad euro 1.000.000,00 a fronte degli originari euro 300.000,00”;

- CUP B41I22000050006 - M5C2I2.2.C - FONDO DE PASQUALE * FONDO DE PASQUALE *COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELLE AREE CIRCOSTANTI FONDO DE PASQUALE NEL COMUNE DI MESSINA – costo totale del progetto 1.300.000 euro, per il quale l'Amministrazione riferisce “Nota Ministeriale prot. n. 28372/24 del 12.03.2024 - Decreto 12.06.2024: Rettifica ed integrazione al decreto 26 giugno 2023, con definizione delle fonti di finanziamento PUI - PNRR e PUI - Nazionale per le singole progettualità - con riduzione dell'importo ad esso connesso per un ammontare pari ad euro 600.000,00 a fronte degli originari euro 1.300.000,00”.

Per n. 3 progetti – di seguito specificati – l'Amministrazione non forniva alcuna motivazione:

- CUP B72C22000070006 - M2C3I1.1 - DON ORIONE SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO G. GALILEI SITO IN VIA COLLODI NEL COMUNE DI SPADAFORA*VIA COLLODI*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO - costo totale progetto 5.814.586,95 euro;

- CUP B41B22001050006 - M4C1I1.3 - MESSINA I.S. BISAZZA PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO CORPO DA DESTINARSI A PALESTRA*VIALE ANNUNZIATA*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE - costo totale progetto 1.953.284,09 euro;

finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, è autorizzata la spesa complessiva di 684 milioni di euro per l'anno 2024, di 785 milioni di euro per l'anno 2025, di 765 milioni di euro per l'anno 2026, di 548,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 400 milioni di euro per l'anno 2028 e di 260 milioni di euro per l'anno 2029”.

- CUP B47G22000050006 - M4C1I1.2 - ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA DEL CONVITTO DELL'ISTITUTO AGRARIO CUPPARI, I.I.S. MINUTOLI*S.P. 35 KM.1.6*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - costo totale progetto 248.370,00 euro.

Sul punto, la Sezione chiedeva chiarimenti.

In sede di riscontro alla bozza di referto, la Città Metropolitana di Messina fornisce i seguenti chiarimenti:

- B72C22000070006 – M2C4I1.1:

- a seguito dei maggiori oneri determinatisi ai sensi del D.L. 50/22 (cd Decreto Aiuti), è stato rideterminato l'importo complessivo necessario per la realizzazione dell'intervento che domanda, codice 3689, sulla base degli elaborati del PFTE vincitore della I° fase del Concorso di progettazione, con Decreto del MEF-Ragioneria Generale dello Stato n. 154 del 19/05/2023 è stata concessa un'integrazione del finanziamento a valere sul "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" (FOI) pari ad € 373.765,83;

- in seguito alla definizione del progetto esecutivo da parte del RTP "Orione", è emerso un aumento dei costi rispetto al quadro economico del PFTE vincitore del concorso di progettazione, in particolare rispetto all'importo iniziale di € 4.373.765,83 (con integrazione FOI) è risultato nel QTE del progetto esecutivo un importo finale complessivo pari ad € 5.814.586,95, con una differenza eccedente pari ad € 1.440.821,12;

- con Decreto Sindacale n. 245 del 31/10/2023 è stata approvata la proposta del RUP di approvazione del progetto esecutivo, con il QTE aggiornato, e di autorizzazione al co-finanziamento di € 1.440.821,12, a valere sul bilancio della Città Metropolitana di Messina;

- l'importo complessivo del cofinanziamento FOI ammonta pertanto ad € 373.765,83; l'importo del cofinanziamento Ente ammonta ad €1.440.821,12; l'importo a valere sulle risorse RRF ammonta ad € 4.000.000,00.

- B41B22001050006 – M4C1I1.3:

- con trasferimento dalla Regione Siciliana, somme vincolate alla progettazione opere pubbliche per un importo pari ad € 130.588,48, si è proceduto all'affidamento adeguamento del progetto definitivo – redazione della progettazione esecutiva e direzione operativa in riferimento alle attività specialistiche relative agli impianti;

- in seguito alla definizione del progetto esecutivo, è emerso un aumento dei costi rispetto al quadro economico del Progetto Definitivo; con Deliberazione del Commissario d Acta con i poteri del Consiglio Metropolitan n. 8 del 25/09/2023 Adozione della salvaguardia degli equilibri di bilancio – Assestamento generale del Bilancio di Previsione 2023/2025 ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 - Applicazione quota di avanzo di amministrazione presunto 2022 - Istituzione risorse di entrata e capitoli di spesa - Riallineamento previsione di cassa e conseguente variazione al Bilancio di Previsione 2023/2025 e al D.U.P. 2023/2025, si è proceduto all'istituzione del capitolo in entrata e del collegato capitolo di spesa.,

scaturente da necessità di una maggiore previsione di spesa identificata quale quota di cofinanziamento progetti PNRR che hanno subito aumento dei costi rispetto ai relativi finanziamenti;

- con Decreto Sindacale n. 219 del 04/10/2023 si è provveduto alla “Variazione al P.E.G. Finanziario 2023/2025 a seguito dell’approvazione della Delibera del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio Metropolitanano n. 8 del 25/09/2023 avente per oggetto: “Adozione della salvaguardia degli equilibri di bilancio – Assestamento generale del Bilancio di Previsione 2023/2025 ai sensi dell’art. 175, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 - Applicazione quota di avanzo di amministrazione presunto 2022 - Istituzione risorse di entrata e capitoli di spesa - Riallineamento previsione di cassa e conseguente variazione al Bilancio di Previsione 2023/2025 e al D.U.P. 2023/2025”. A seguito della suddetta variazione al bilancio, sono state rese disponibili le ulteriori risorse a copertura dei maggiori costi scaturenti dalla progettazione esecutiva pari ad € 38.056,85.

- L’importo complessivo del cofinanziamento Ente ammonta pertanto ad € 168.645,33; l’importo a valere sulle risorse RRF ammonta ad € 1.953.284,09.

- B47G22000050006 – M4C1I1.2:

- al momento della candidatura all’avviso emanato da Ministero dell’Istruzione e del Merito, la domanda di finanziamento è stata presentata per un importo di € 275.400,00; l’Amministrazione Titolare ha ravvisato che alcune voci di spesa non rientravano tra quelle ammissibili a finanziamento chiedendo pertanto di eliminarle; per quanto sopra la candidatura è stata rimodulata per l’importo di € 248.370,00, successivamente finanziata con risorse RRF.

La Sezione ne prende atto.

3. PROGETTI CON SOGGETTI ATTUATORI ESTERNI

La Città Metropolitana di Messina ha informato la Sezione di essere soggetto attuatore di tutti i progetti indicati nel riscontro istruttorio e di essersi avvalso, ai fini della loro attuazione, di enti strumentali (soggetto sub-attuatori), di volta in volta individuati nei diversi Comuni della provincia, destinatari degli interventi.

La Sezione rilevava che tali enti erano stati inseriti in ReGIS nell’apposita sezione “Soggetti correlati”.

In riferimento a detti soggetti, l’Ente, in sede di riscontro istruttorio alla bozza di referto, spiega che ricade in capo agli stessi la responsabilità del caricamento ed aggiornamento tempestivo su ReGIS.

Si tratta dei seguenti interventi:

Tabella 7 - Soggetti sub-attuatori

Missione - Componente - Investimento	CUP	Denominazione progetto	Soggetto Sub-attuatore
M2C4I3.1	F42F22000520006	COMUNE DI MESSINA*PROVINCIALE 35*INTERVENTO DI FORESTAZIONE URBANA DEL COMUNE DI MESSINA AREA BURGENSATICO DI PEZZOLO	COMUNE DI MESSINA
M2C4I3.1	E32F22000290006	INTERVENTO DI IMBOSCHIMENTO CON FINALITÀ PROTETTIVE DA RISCHIO IDROGEOLOGICO IN CONTRADA PUZZO DEL COMUNE DI ALÌ*CONTRADA PUZZO*INTERVENTO DI IMBOSCHIMENTO CON FINALITÀ PROTETTIVE DA RISCHIO IDROGEOLOGICO IN CONTRADA PUZZO DEL COMUNE DI ALÌ	COMUNE DI ALÌ
M2C4I3.1	F82F22000720006	PROGETTO DI FORESTAZIONE DI SUPERFICI EXTRAURBANE, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO, PER LA PREVENZIONE, RIPRISTINO E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ*VIA TERRITORIO COMUNALE MONTANO*INTERVENTO DI FORESTAZIONE E RIPRISTINO DI AREE PERCORSE DA INCENDIO PREVISTA IN 53.21.20 ETTARI	COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO
M2C4I3.1	I12F22000400006	INTERVENTO DI FORESTAZIONE URBANA PERIURBANA ED EXTRAURBANA NEL COMUNE DI OLIVERI DENOMINATO RESPIRA OLIVERI*VIA TERRITORIO DEL COMUNE DI OLIVERI*INTERVENTO DI FORESTAZIONE URBANA PERIURBANA ED EXTRAURBANA NEL COMUNE DI OLIVERI	COMUNE DI OLIVERI

M2C4I3.1	F42F22000470006	FORESTAZIONE DI SUPERFICI EXTRAURBANE, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LIBRIZZI, PER LA PREVENZIONE, RIPRISTINO E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ, CON FINALITÀ PRINCIPALMENTE CLIMATICO-AMBIENTALE, PROTETTIVE, PAESAGGISTICHE E SOCIALI*CAVALLAZZO ECC*FORESTAZIONE DI SUPERFICI EXTRAURBANE, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LIBRIZZI, PER LA PREVENZIONE, RIPRISTINO E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ, CON FINALITÀ PRINCIPALMENTE CLIMATICO-AMBIENTALE, PROTETTIVE, PAESAGGISTICHE E SOCIALI	COMUNE DI LIBRIZZI
M2C4I3.1	J82F22000460006	CASTROREALE GREEN	COMUNE DI CASTROREALE
M2C4I3.1	C62F22000520006	TERRITORIO MONTANO COMUNALE CCR CORRIDOIO ECOLOGICO - STRADE CITTADINE PARCO URBANO AREA PIP ZONE ADIACENTI CAMPO SPORTIVO*ZONA MONTANA E AREE URBANE*FORESTAZIONE URBANA ED EXTRAURBANA	COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
M2C4I3.1	D22F22000640006	INTERVENTI DI FORESTAZIONE NEL COMPRESORIO DELLA VALLE DELL'ALCANTARA*LOCALITÀ VARIE*INTERVENTI DI FORESTAZIONE DA REALIZZARSI NEL COMPRESORIO DELLA VALLE DELL'ALCANTARA NEI COMUNI DI FRANCAVILLA DI SICILIA, GAGGI, GIARDINI NAXOS, GRANITI, MALVAGNA, MOIO ALCANTARA, MOTTA CAMASTRA E TAORMINA	COMUNE DI MOTTA CAMASTRA
M2C4I3.1	E62F23000250001	COMUNE DI MILITELLO ROSMARINO (ME)*FOGLIO 1 PART. 112; FOGLIO 3 PARTT. 39 E 51; FOGLIO 9 PARTT. 17 E 283.*INTERVENTO DI RIMBOSCHIMENTO IN AREE URBANE	COMUNE DI MILITELLO ROSMARINO

M2C4I3.1	D12F23000490001	INTERVENTO DI FORESTAZIONE URBANA, PERIURBANA ED EXTRAURBANA DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR, MISURA 2 COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO" - COMUNI DI VILAFRANCA TIRRENA E SAPONARA*SERRO*RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE CON INTERVENTO DI RIMBOSCHIMENTO	COMUNE DI VILAFRANCA TIRRENA
M2C4I3.1	I32F23000420006	PROGETTO DI FORESTAZIONE DI SUPERFICI EXTRAURBANE, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TUSA, PER LA PREVENZIONE, RIPRISTINO E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ, CON FINALITÀ PRINCIPALMENTE CLIMATICO-AMBIENTALE, PROTETTIVE, PAESAGGISTICHE E SOCIALI.*TARDARA*PROGETTO DI FORESTAZIONE DI SUPERFICI EXTRAURBANE, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TUSA, PER LA PREVENZIONE, RIPRISTINO E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ, CON FINALITÀ PRINCIPALMENTE CLIMATICO-AMBIENTALE, PROTETTIVE, PAESAGGISTICHE E SOCIALI.	COMUNE DI TUSA
M2C4I3.1	E32F23000340006	INTERVENTO DI IMBOSCHIMENTO CON FINALITÀ PROTETTIVE DA RISCHIO IDROGEOLOGICO IN CONTRADA PUZZO-GABBIA ALLE PENDICI DI MONTE SCUDERI NEL COMUNE DI ALÌ*CONTRADA PUZZO/GABBIA*IMBOSCHIMENTO CON FINALITÀ PROTETTIVE DA RISCHIO IDROGEOLOGICO IN CONTRADA PUZZO-GABBIA ALLE PENDICI DI MONTE SCUDERI NEL COMUNE DI ALÌ	COMUNE DI ALÌ

M2C4I3.1	F82F23000590006	PROGETTO DI FORESTAZIONE DI SUPERFICI EXTRAURBANE, RIPRISTINO E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ, SITO NEL COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO*TERRITORIO COMUNALE*INTERVENTO DI FORESTAZIONE E RIPRISTINO DI AREE PERCORSE DA INCENDIO PREVISTO SU HA 30.56.98	COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO
M2C4I3.1	G82F23000240001	INTERVENTO DI FORESTAZIONE NEL COMUNE DI NIZZA DI SICILIA*VIA TERRITORIO COMUNALE*INTERVENTO DI FORESTAZIONE NEL COMUNE DI NIZZA DI SICILIA	COMUNE DI NIZZA DI SICILIA
M2C4I3.1	H92F23000390006	PROGETTO DI FORESTAZIONE DI SUPERFICI EXTRAURBANE, RIPRISTINO E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ, SITO NEL COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA*C/DA IEMELLO*FORESTAZIONE DI SUPERFICI EXTRAURBANE, RIPRISTINO E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ, SITO NEL COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA	COMUNE DI NOVARA DI SICILIA
M2C4I3.1	B92F23000350001	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO. INTERVENTO DI FORESTAZIONE NELLE CITTÀ METROPOLITANE. COMUNE DI MALVAGNA.*BOSCO PITTARI*INTERVENTO DI FORESTAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MALVAGNA - CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA.	COMUNE DI MALVAGNA

M2C4I3.1	F42F23000500006	PNRR M2C4 - I3.1 - AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO DI FORESTAZIONE URBANA, PERIURBANA ED EXTRAURBANA NELLE CITTÀ METROPOLITANE DEL 02/05/2023*PEZZOLO*INTERVENTO DI FORESTAZIONE URBANA DEL COMUNE DI MESSINA AREA BURGENSATICO DI PEZZOLO-2° INTERVENTO	COMUNE DI MESSINA
M2C4I3.1	D22F23000690007	TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITI NELLE CONTRADE BARATTA, STELLA E VORNA IN AGRO DEL COMUNE DI ALCARA LI FUSI.*CONTRADE BARATTA, STELLA, VORNA*PROGETTO PER L'IMBOSCHIMENTO E L'ACCRESIMENTO DEL VALORE ECOLOGICO E SOCIALE DI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE	COMUNE DI ALCARA LI FUSI
M2C4I3.1	E72F23000590006	FORESTAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN FRATELLO*C.DA LINERI, PORTE, GIANFI...*INTERVENTI DI FORESTAZIONE	COMUNE DI SAN FRATELLO
M5C2I2.3.2	F41B21000640001	RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI AMBITI DI RISANAMENTO DELLA ZONASUD DELLA CITTA' DI MESSINA DESTINATA ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE URBANA E ALLA DOTAZIONE DI SERVIZI*VIA BISCONTE FONDO FUCILE RIONE TAORMINA*RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI AMBITI DI RISANAMENTO DELLA ZONASUD DELLA CITTA' DI MESSINA DESTINATA ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE URBANA E ALLA DOTAZIONE DI SERVIZI	COMUNE DI MESSINA

4. INCARICHI ESTERNI

Con la nota istruttoria prot. Cdc n. 4398 del 04/06/2024, la Sezione aveva chiesto di fornire informazioni anche in merito ad *“eventuali incarichi esterni, anche tecnici, conferiti, esplicitando le modalità di affidamento e la fonte legislativa alla base del conferimento”*.

In sede di riscontro istruttorio, la Città Metropolitana di Messina non aveva indicato il conferimento di alcun incarico esterno.

A seguito di risposta alla bozza di referto, l'Ente ha trasmesso i dati inerenti l'affidamento di incarichi conferiti.

La Sezione ne prende atto.

5. ALTRE INFORMAZIONI

In fase istruttoria, era stato richiesto all'Ente di segnalare eventuali criticità riscontrate nella realizzazione dei progetti e nelle loro modalità di rendicontazione.

La Città Metropolitana di Messina aveva indicato alcune situazioni di difficoltà per i seguenti CUP:

- CUP I12F22000400006 - M2C4I3.1 - INTERVENTO DI FORESTAZIONE URBANA PERIURBANA ED EXTRAURBANA NEL COMUNE DI OLIVERI DENOMINATO: RESPIRA OLIVERI*VIA TERRITORIO DEL COMUNE DI OLIVERI*INTERVENTO DI FORESTAZIONE URBANA PERIURBANA ED EXTRAURBANA NEL COMUNE DI OLIVERI - *"l'area originariamente individuata per l'intervento, era stata oggetto di concessione comunale a privati per pascolo. Successivamente il Comune sub-attuatore ha richiesto ed ottenuto, da parte del MASE, la variazione dell'area di intervento su nuova area privata percorsa dal fuoco nel mese di luglio 2023, previa stipula di apposita convenzione trentennale con il privato e deroga rilasciata dal Dipartimento Regionale Agricoltura";*

- CUP B41B20001410002 - M4C1I3.3 - I.I.S. VERONA TRENTO*VIA UGO BASSI*LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE OFFICINE E RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DI ISTRUZIONE SECONDARIA - *"l'Obbligazione Giuridicamente Vincolante non è stata perfezionata alla data del 31/12/2023".*

In sede di riscontro alla bozza di referto, l'Ente le conferma.

